ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

000001

ASUNCION, 02 de mayo de 2016.

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA SECRETARIA

ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS EN LA RCA DEL PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

6922

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES

OUC – DIRECCION JURIDICA

SENAVITAT 03 MAY 2016 MESA DE ENTRADAS

De mi consideración:

Por la presente solicito **URGIMIENTO** de respuestas a las notas presentadas en fechas:

26 de enero de 2016 EXP 1702-16

16 de febrero de 2016 EXP 2819-16ª

7 de abril de 2016 EXP 5549-16 A

Las mismas hacen referencia a solicitudes de Prórrogas Contractuales solicitadas con las documentaciones que acompañaron, y a la vez presentamos los **nuevos CRONOGRAMAS DESPLAZADOS DE TERMINACION DE OBRA** con nuevas fechas de culminación en las localidades de ALEMAN CUE Y TACUATY POTY.

Con las actualizaciones documentales al 31 de marzo de 2016 las fechas previstas de terminación solicitadas son las siguientes:

ALEMAN CUE 5 DE ABRIL 2016

TACUATY POTY 3 DE MAYO 2016

Los Convenios Modificatorios a la fecha firmados por mi empresa, llegan hasta el **Número 7**, desconocemos otra si lo hay, y en ella solo se contemplan eventos compensatorios hasta el 6 de enero de 2016 y estamos desactualizados en los plazos porque no se respondieron las notas más arriba mencionadas. Las fechas de terminación en ella insertadas (Nº 7) son **el 29 de enero y 17 de marzo de 2016,** respectivamente para las localidades de A CUE y TACUATY POTY.

La falta de respuesta ocasiona INSERTIDUMBRE, ya que nuevamente la FALTA DE SEGURIDAD en la zona de TACUATY POTY con el Asesinato del amigo Intendente Sr. Ramón Carrillo, también hace que hayamos solicitado **UNA SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS por 30 días (EXP Nº 6377-16)**, hasta tanto vuelva la Normalidad en dicha localidad, NOSOTROS POR NUESTRA EXPERIENCIA YA VIVIDA creemos que es lo mejor, hablamos por nuestra SEGURIDAD y la de nuestros OBREROS Y CONTRATISTAS, no nos hacemos eco de otras PERSONAS ni de OTRAS EMPRESAS, sino por nosotros mismos. Todo de vuelta se ralentiza, y poco a poco tomaremos nuevamente el ritmo para el último tramo de obras faltantes.

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

De las llanas 1317 y Mayor Martínez Tel./Fax: 420 692 email: antocabr@rieder.net.py

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

Hemos pasado por INUNDACIONES, localidad AISLADA y la FALTA DE SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE OBRAS, y aun así no hemos dejado de hacer lo que humanamente es posible, y creemos que todo lo expuesto amerita tomar en consideración todo lo solicitado para culminar felizmente dichas obras, y será estrictamente JUSTO hacerlo.

Todo el costo administrativo de estar tanto tiempo lo hemos absorbido hasta la fecha, sin haber solicitado RESARCIMIENTO por ello, y más cuando que el ULTIMO CERTIFICADO COBRADO A LA FECHA ES EL NUMERO 7 de trabajos realizados en A CUE (meses de Nov –Dic 2015) a quién inclusive le aplicaron MULTA que para nosotros no es aceptable , por lo cual también esperamos ponernos de acuerdo con los técnicos de Sembrando, ya se han presentado hasta el Nº 10 de A CUE (final) culminando las obras allí dentro de los plazos solicitados (EXP Nº 5224-16 A Y 5896-16ª) , y el Nº 11 DE TACUATY POTY (PENULTIMO Y EN CORRECCIÓN) , no hemos cobrado Nº 8, Nº 9, Nº 10 de A CUE y los Nº 9, Nº10 de TACUATY POTY , por lo que la financiación de terminación de las mismas también hemos absorbido con los altos costos que las mismas representan.

SRA. Ministra y a quienes corresponda, por favor tengan a bien tomar en consideración todo lo expuesto y lleguemos JUNTOS a la FELIZ conclusión del Contrato, para bien de nuestros Compatriotas beneficiarios, sin agregar más inconvenientes a los muchos que ya sucedieron en el lapso transcurrido.

Sin otro particular, le saludo con mi consideración más distinguida.

Ing. Antonio Cabrera B.

Contratista
Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

.Adjuntamos copias notas presentadas y recortes periodísticos

De las llanas 1317 y Mayor Martínez **Tel./Fax: 420 692** **email: antocabr@rieder.net.py**

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
CABRERA BURGOS
ANTONIO RAFAEL

FECHA DE NACIMIENTO
23-10-1959

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION

FECHA DE VENCIMIENTO
20-01-2020

606020

IC: 003-22441959-071 UBICACION: PN-11-21-001-020
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 20-01-2010

Crio.Ppal.MCP.Juan Eliseo Baez Ch.
Jefe Dpto.de Identificaciones

IDPRY606020<<<4<<<<<<<<<<<<<<<
5910232M2001207PRY<<<<<<<<<<<6
CABRERA<BURGOS<<ANTONIO<RAFAEL

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

LUNES 25 DE ABRIL DE 2016

000004

COLOR abc

UN DIARIO JOVEN CON FE EN LA PATRIA

Asunción Paraguay | AÑO 49 N° 15.881 | 112 páginas G. 6.000 | www.abc.com.py

Acribillan al intendente de Tacuatí

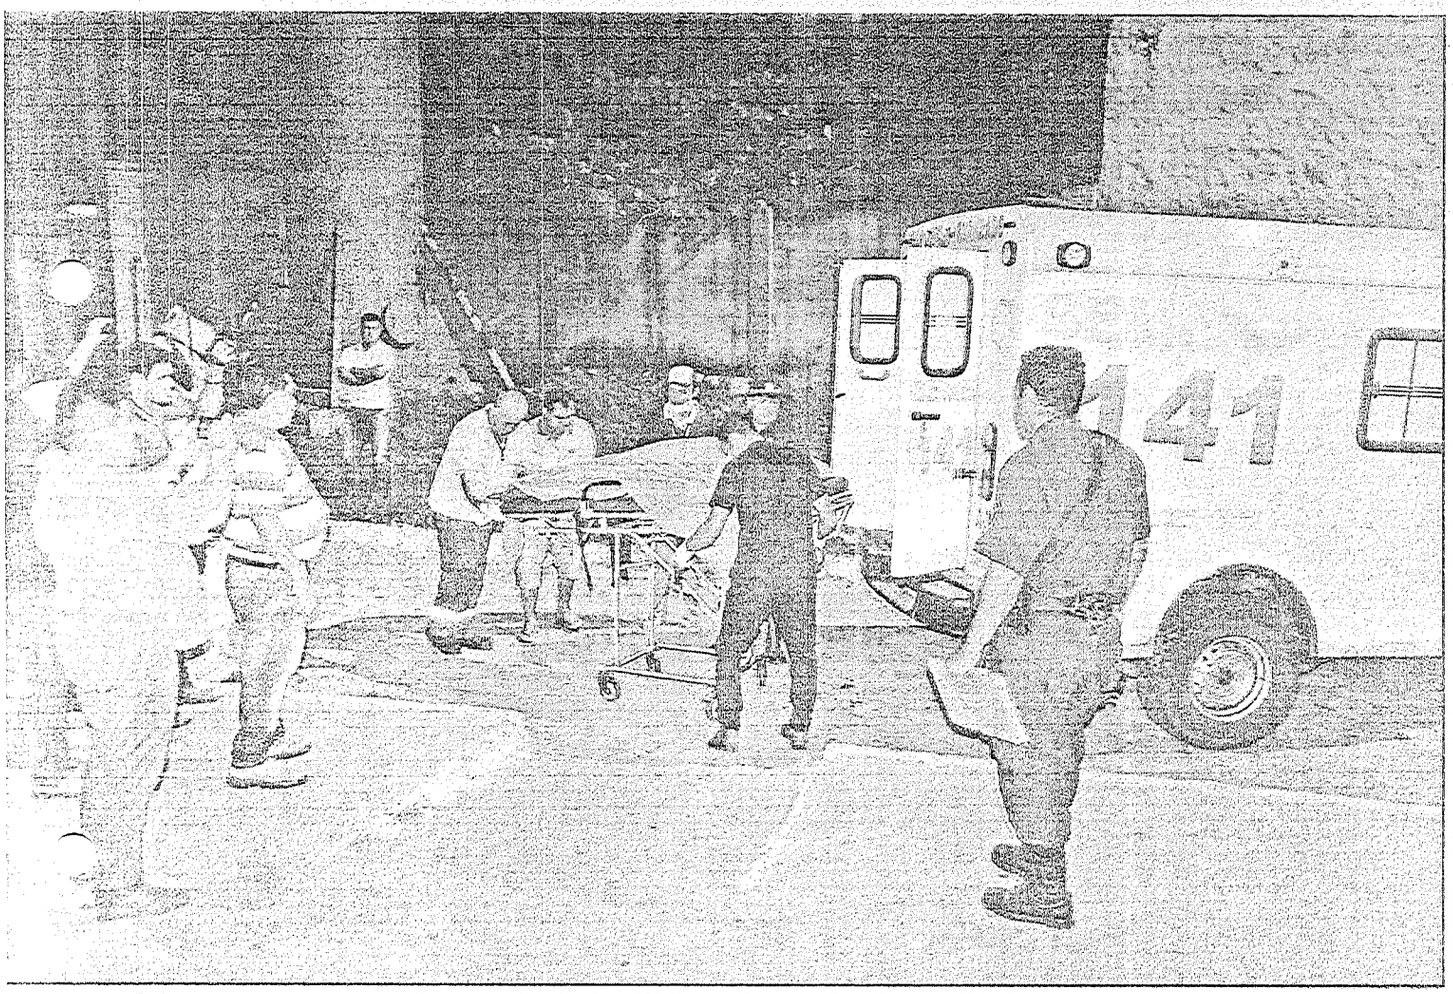

El intendente de Tacuatí, Dpto. de San Pedro, Walberto Ramón Carrillo (ANR), fue acribillado por dos sicarios en pleno centro de la ciudad, en la tarde de ayer. Se habla de trasfondo político, aunque no se descarta un posible nexo con la banda criminal del EPP. En la foto, momento en que el cuerpo llega a la morgue en Santa Rosa del Aguaray. En otro hecho luctuoso ocurrido anoche fue asesinada una joven empresaria en Choré. **Pág. 41**

HIPÓTESIS APUNTAN A UN TRASFONDO POLÍTICO, AUNQUE NO DESCARTAN VÍNCULO

000005

Acribillan al intendente de Tacu

plena zona de operaciones de l

El intendente del distrito sampedrano de Tacuatí, Walberto Ramón Carrillo (ANR), fue acribillado por dos sicarios en el centro de la ciudad, poco después de salir de su casa. El asesinato fue en plena tarde de ayer y en el teatro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Las hipótesis preliminares se centran en un trasfondo político, sin descartar una posible conexión con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La diputada colorada Perla de Vázquez consuela a los familiares del jefe comunal acribillado en la tarde de ayer por dos sicarios que huyeron.

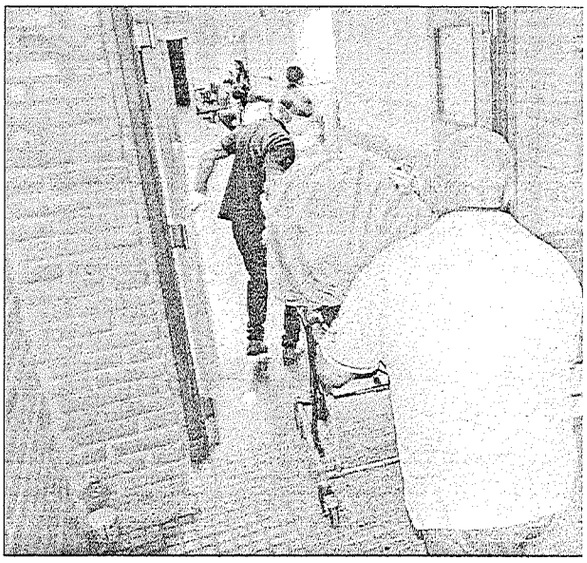

El cadáver del intendente de Tacuatí, Walberto Ramón Ca camilla al Hospital de Santa Rosa del Aguaray, para la rea

El acribillamiento del intendente de 46 años se ejecutó a las 17:20 de ayer sobre la avenida Pa'i Ayala casi calle Alegre, a unos 20 metros de la estación de Copaco de la ciudad.

El informe de la Jefatura de Policía del Departamento de San Pedro da cuenta de que, momentos antes del asesinato, Carrillo asistió al acto inaugural del campeonato de la Liga Tacuateña de Fútbol, que tuvo lugar en la cancha del club General Bernardino Caballero.

Una vez culminado el encuentro futbolístico, abordó su motocicleta Kenton GTR de 150 cilindradas, de color rojo y sin chapa, para ir rumbo a su domicilio. Cuando llegó, Carrillo se disponía a descansar, instante en que recibió una llamada en su celular de parte de su hija de 13 años. Esta le dijo que estaba estudiando con una compañera y pidió que pasara a buscarla.

El intendente abordó nuevamente el biciclo y fue hasta la vivienda donde estaba la niña, pero mientras la aguardaba aparecieron dos hombres en una motocicleta tipo trail, quienes sin mediar palabras efectuaron varios disparos contra su humanidad. El ataque fue presenciado por la propia hija.

Walberto Ramón Carrillo Vera, asesinado a tiros.

Carrillo acusó cuatro impactos de bala, principalmente en el brazo izquierdo y la cabeza, de cuya consecuencia se desvaneció y cayó del biciclo, falleciendo minutos después. Una vez consumado el crimen, los desconocidos emprendieron una rauda fuga hacia la localidad de Tacuatí Poty.

La fiscala Fani Aguilera dispuso el traslado del cuerpo de Carrillo hasta la morgue del hospital de Santa Rosa del Aguaray, donde fue sometido a una autopsia a cargo del forense Pedro Pablo Araújo.

Posibles hipótesis

Familiares del intendente asesinado se limitaron a dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, el concejal Teodosio Mussi (ANR), cuñado de Carrillo, señaló que su allegado nunca recibió amenazas, aunque dijo que tiene importantes adversarios políticos dentro del mismo Partido Colorado, como así también de la oposición.

Lo llamativo también es que el asesinato se ejecutó en plena tarde y en la zona donde la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) centra su lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La ejecución de Li

El antecedente más inmediato de un suceso similar al de ayer, que derivó en el asesinato de un connotado político del distrito de Tacuatí, se remonta al 31 de mayo de 2013, cuando los integrantes de la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) eliminaron a tiros al exintendente de esa ciudad y empresario ganadero Luis Alberto Lindstron Picco, de 63 años.

Esa mañana, el productor fue emboscado y acribillado por los miembros del grupo armado, cuando iba al mando de su camioneta en un camino interno de la estancia "Santa Amalia", colindante con la hacienda "Paso Itá" de la ganadera Marys Llorens. Está a 12 kilómetros del casco urbano de Tacuatí.

Fuentes de inteligencia revelaron que el crimen de Lindstron guardaría directa relación con la detención de Froilán Escurra Cardozo,

Luis Alberto Lindstron fue miembros del autonombra

supuesto responsable de asesinato del tractorist Santiago Morel Leiva quien justamente trabajab para el estanciero.

A dos semanas del so nado caso, la Policía y la Fuerzas Armadas fracasa ron rotundamente en la bús queda de los responsables.

Su secuestro

Cinco años antes de qu se materializara su asesi

HABLAN DE UN FUERTE QUIEBRE ENTRE LOS COLORADOS DE LA ZONA

Asesinato del intendente de Tacuatí habría sido por cuestiones políticas

El asesinato del intendente de Tacuatí, Ramón Carrillo (ANR), habría sido consecuencia de un quiebre político entre colorados de la zona, según las primeras versiones que surgen sobre el móvil de su muerte. Incluso se habla de una fuerte puja de poderes y pago de sobornos en torno a la elección del titular de la Junta Municipal. Lentamente se descarta la participación del EPP en el crimen.

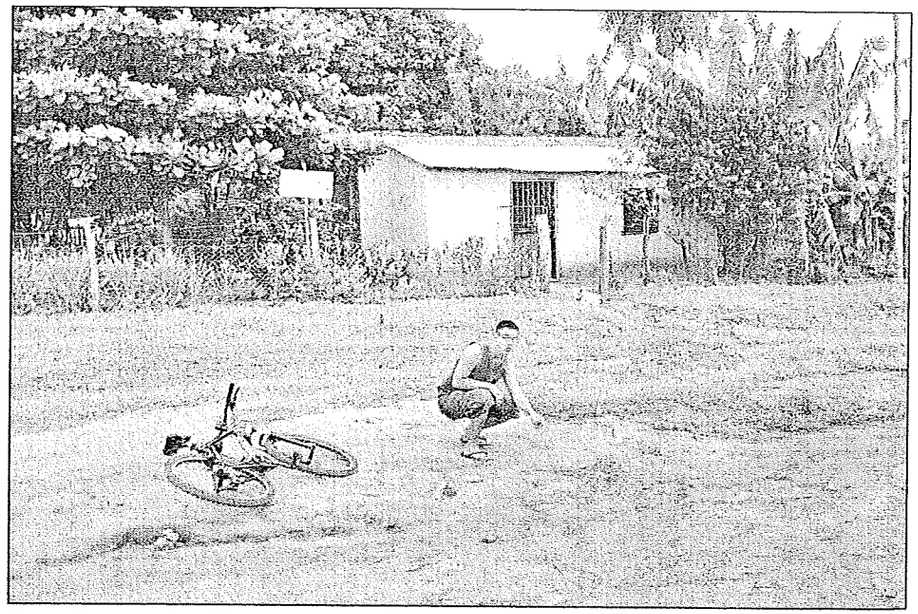

Un vecino muestra el lugar donde cayó el cuerpo acribillado del intendente de Tacuatí, Ramón Castillo (ANR), el domingo a la tarde.

Las primeras investigaciones del asesinato del intendente de Tacuatí, Walberto Ramón Carrillo (ANR), apuntan a un crimen con tinte político. De acuerdo a los datos a los que accedió este diario, una lucha interna dentro del Partido Colorado en el distrito sampedrano habría desencadenado en el crimen de la autoridad.

De esta forma, de a poco, se descarta que el grupo terrorista EPP haya tenido participación en la muerte que conmocionó la zona.

Desde las elecciones internas de la ANR realizadas en julio de 2015, supuestamente las rencillas dentro del seno de la agrupación colorada en Tacuatí no cesaron y dio pie a todo tipo de especulaciones.

Puja de poderes

Una de las versiones más fuertes sobre el crimen es que, presumiblemente, para la elección del presidente de la Junta Municipal hubo una puja de poderes.

Supuestamente, uno de los contrarios a Carrillo en las internas habría pagado G. 10 millones para evitar que el candidato del jefe comunal asesinado consiguiera la titularidad del órgano legislativo municipal.

Fue así que el edil Hipólito "Kamba" Larrea del Frente Guasu se impuso por cinco votos a favor y tres en contra, evitando de esa forma que el concejal afín a Carrillo presidiera la Junta. Esto habría agudizado el quiebre dentro de la ANR en Tacuatí.

Walberto Ramón Carrillo (lista 2C) se enfrentó en las internas coloradas para las Municipales a Flavio Silva (lista 2A) y Alberto Torres (lista 2B), aunque los tres formaban parte del equipo de Honor Colorado liderado por J. J. Vázquez. El cuarto candidato fue Sindulfo Franco (lista 2E) respaldado por el diputado Freddy D'Ecclesiis, también del cartismo.

Sicario

A Gildo Villa Alta, conocido por el alias de "Korea'i", oriundo de Jaguarete Forest, se lo habría visto la semana pasada en la zona de Castillo Cue, distrito de Tacuatí. El presunto sicario tiene varias órdenes de captura y es uno de los sospechosos de ser el autor material del asesinato.

Testigo

Catalina Bazán de Rodríguez, propietaria de la casa donde se encontraba estudiando la hija del político, aseguró ayer que el fallecido paró su motocicleta frente a la vivienda para recoger a su hija y en ese momento llegaron los sicarios y materializaron el crimen.

Uno de los disparos que recibió Carrillo fue de corta distancia, se sospecha que uno de los asesinos bajó de la motocicleta y le disparó cuando ya estaba en el suelo, momento en que el casco del sicario cayó al suelo y ya no tuvo tiempo de levantarlo.

Para Jardín

VAN DESCARTANDO VÍNCULOS CON NARCOTRÁFICO Y EPP

Ratifican que hubo trasfondo político en homicidio de intendente

La hipótesis sobre el motivo del asesinato del jefe comunal de Tacuatí, Ramón Carrillo (ANR), se centra en cuestiones políticas y se descartan prácticamente vínculos con el narcotráfico o el EPP. Así señalaron policías encargados de la investigación.

En la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, responsables de investigar el asesinato del intendente Carrillo ofrecieron una conferencia de prensa y dijeron que en el trascurso de la semana podrían ofrecer novedades.

El jefe de Policía del segundo departamento, comisario Luis Bernal; el jefe de antisecuestro, comisario Gilberto Fleitas; y el de Investigación de Delitos, comisario Marcelino Estigarribia, participaron de la conferencia de prensa.

El encargado de Antisecuestro, comisario Fleitas, dijo que están trabajando coordinadamente con todas las unidades policiales, con apoyo técnico de Asunción, igualmente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para esclarecer el crimen.

Aseguró que cuentan con un cúmulo de informaciones para hallar a los autores materiales del hecho. "Hemos hablado con mucha gente que aportó características de los autores y estamos corroborando", dijo. Agregó que entregaron informes al Ministerio Público para que tomen las medidas que correspondan.

En cuanto a la hipótesis del asesinato manifestó que queda atrás el tema narcotráfico o vinculaciones con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y se centran en cuestiones políticas, pero no ahondó en detalles "para no entorpecer los trabajos". El titular de la Junta Municipal de Tacuatí, Hipólito "Kamba" Larrea (de Frente Guasu) asumirá mañana interinamente la intendencia del distrito en lugar de Ramón Carrillo (ANR).

Comisarios Luis Bernal, Gilberto Fleitas (c) y Marcelino Estigarribia, durante la conferencia de prensa.

APC
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE CARRETERAS
CONVOCATORIA

Un rayo mató veintidós animales

000007

COMANDANTE SE REUNIÓ CON CARTES

Hay cautela policial sobre asesinatos en San Pedro

Datos acerca de los asesinatos del intendente de Tacuatí, Ramón Carrillo (ANR), y de una empresaria en Choré son manejados con cautela, según se desprende de declaraciones del comandante de la Policía, Críspulo Sotelo. No quiso hablar sobre el posible motivo del crimen y pidió aguardar.

El presidente de la República, Horacio Cartes, se reunió en la mañana de ayer con el comandante de la Policía. Al término del encuentro, Sotelo habló sobre el asesinato del intendente de Tacuatí ocurrido el sábado último, pero prefirió no hacer mayores precisiones ni comentarios sobre eventuales motivos del crimen.

Indicó que se están llevando adelante los trabajos de investigación y que se espera tener resultados en los próximos días.

En cuanto al asesinato de la empresaria Nora Florenciano, cometido en Choré (San Pedro) también el sábado, el jefe policial indicó que hay un detenido y que será interrogado.

Al ser insistido por más precisiones acerca de los dos homicidios, Sotelo optó por no dar detalles y pidió tener paciencia para poder llegar a los culpables. "En ambos casos ya tenemos algunos elementos para dirigir los procedimientos con los agentes fiscales. Fallecieron dos personas y los trabajos técnicos realizamos a través de los elementos encontrados en las escenas de los crímenes, los estamos evaluando, eso va a orientar mejor la investigación", insistió.

Críspulo Sotelo, comandante de la Policía Nacional, en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

En cuanto a los plazos para tener resultados, el comandante de la Policía Nacional indicó que ojalá sea lo antes posible.

Marcha tranquila

Acerca de la marcha campesina (que concluyó el sábado último) y del informe que entregó al presidente Cartes, Sotelo indicó que en general fue una movilización tranquila que se pudo manejar.

Explicó que entregó al Jefe de Estado un informe por escrito en el que se detallan todos los aspectos de la movilización de los agricultores y cooperativistas y el trabajo que realizó la Policía en esos días.

000008

EN MEDIO DE CONFUSAS MANIOBRAS ELIGEN A INTENDENTE INTERINO

Detienen a concejal colorado Alfredo Sosa por asesinato del intendente de Tacuatí

La detención del concejal colorado Alfredo Sosa Riella, de otros tres sospechosos y la incautación de posibles evidencias fueron el resultado de seis allanamientos realizados ayer en la investigación del asesinato del intendente de Tacuatí Ramón Carrillo (ANR). En medio de maniobras, eligieron a Teodoro Mussi (ANR) como jefe comunal interino.

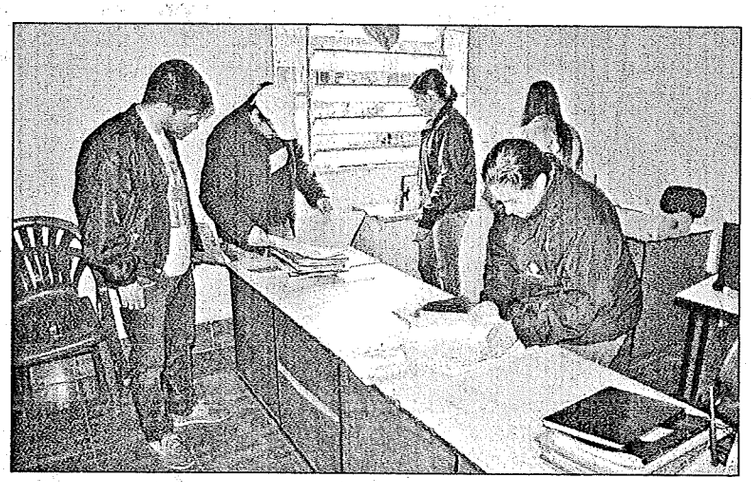

Agentes fiscales en plena tarea de verificación de documentos, en uno de los allanamientos hechos ayer.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la fiscala Fani Aguilera y de efectivos de Antisecuestro bajo el mando del comisario Gilberto Fleitas. Tras los procedimientos informaron que hubo cuatro detenidos y que una importante cantidad de evidencias serán trasladadas a la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro).

Entre los detenidos figura **Alfredo Sosa Riella**, concejal colorado con varios antecedentes policiales. Según los investigadores, este edil estaría implicado en el homicidio del intendente Carrillo, ocurrido el pasado domingo, pues existen varias evidencias que le vinculan con el caso. También fueron detenidos **Sindulfo Franco y Juan López**, políticos colorados, y **Jorge Larrea**, hijo del titular de la Junta Municipal de Tacuatí, Hipólito Larrea (Frente Guasu). Pero el caso de Jorge fue por tenencia de marihuana y no por el homicidio.

Intendente interino

Los concejales colorados Ramón Pérez (vicepresidente de la Junta), Teodosio Mussi, Mario Martínez, Eusebio Riella y Sebastián Alfonzo (Unace), con asesoramientos de funcionarios de la Gobernación San Pedro, se reunieron y como primer punto del orden del día decidieron destituir al titular de la Junta, Larrea (FG). En reemplazo designaron a Mussi (ANR) como intendente interino, quien es cuñado del jefe comunal asesinado.

A raíz de esta situación, Larrea adelantó que accionará en los estrados judiciales. "La ley es clara. El presidente (de la Junta) debe asumir y si no vamos a respetar las leyes y las instituciones, ¿para qué vamos a seguir?", cuestionó.

Según Larrea, tenía que asumir el cargo de intendente interino hasta que los electores de Tacuatí elijan al nuevo intendente.

Viuda se candidata

Por otra parte, la viuda del intendente Carillo, Miguela Colmán (supervisora de Educación), confirmó ayer su intención de postularse para el cargo que quedó vacante tras la muerte de su esposo. "Tengo esa fuerza para candidatarme para la intendencia", expresó.

Señaló que será una forma de honrar la memoria de Carrillo, quien "trajo muchas viviendas para los campesinos, consiguió la doble avenida para Tacuatí, empedrados, muchos proyectos", recordó.

Pobladores de la zona urbana de Tacuatí realizaron ayer una movilización por las principales calles de la ciudad, pidiendo el fin de la violencia y el esclarecimiento del homicidio.

Senadores recordaron a Ramón Carrillo

Con un minuto de silencio y de pie (foto), los senadores rindieron homenaje al intendente colorado de Tacuatí (San Pedro), Walberto Ramón Carrillo, quien fue asesinado el domingo pasado. El pedido fue realizado por la senadora Desirée Masi

blo al elegir a un intendente con un asesinato y hacer un nuevo llamado a elecciones y todos sabemos que ese camino no conduce a nada", agregó.

Criticó al ministro de Interior, Francisco de Vargas, por señalar que el crimen "se



Gran Hotel del Paraguay
El Gran Hotel del Paraguay

TACUATÍ SE MANIFIESTA Y EXIGE ACLARAR MUERTE DE INTENDENTE

Viuda pide a Cartes que "la plata no apañe la justicia"

En medio del temor y supuestas amenazas de más muerte, pobladores del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, tomaron las calles de la ciudad para exigir el cese de violencia y justicia por el asesinato del intendente Ramón Carrillo (ANR). Su viuda pidió al Presidente de la República que "la plata no apañe la justicia".

Con los gritos de "Carrillo vive", "Basta de violencia", "queremos justicia", familiares, amigos, vecinos y pobladores en general de Tacuatí marcharon ayer por las calles de la ciudad exigiendo justicia y castigo para los asesinos del intendente colorado Ramón Carrillo, quien fue ultimado a tiros a plena luz del día el pasado domingo 24 de abril.

La viuda de Carrillo, Miguela Colmán, encabezó la marcha, habló a los presentes y aseguró que después de la muerte del intendente, "nace otro Tacuatí, un Tacuatí más humano".

También envió un mensaje al presidente de la República, Horacio Cartes, y le pidió que se esclarezca el caso. "Pido al Presidente que así como no pudo el poder del dinero con la voluntad del pueblo para elegir al intendente acá, que esta vez la plata no esté apañando la justicia humana, pido al Presidente dar honra a un hombre trabajador", expresó.

Colmán reiteró su intención de seguir con el proyecto político que inició su esposo y aseguró que ya empezó a prepararse para ser candidata en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en los próximo meses para elegir a un nuevo intendente.

Miguela Colmán (c), viuda del intendente Ramón Carrillo (ANR), acompañada de sus hijas e hijo, encabezó ayer la marcha exigiendo justicia por la muerte de su marido.

Por su parte, Teodosio Mussi (ANR), actual intendente interino elegido en una dudosa maniobra política, pidió unidad y honrar la muerte de Carrillo. "Pido que estemos fuertes y que nos acompañemos todos para honrar la sangre de nuestro líder Ramón Carrillo que murió por amor a nosotros".

Se temen más muertes

Varios líderes políticos analizan aún la posibilidad de presentar hoy una denuncia formal, ante las supuestas amenazas de muerte a unas cinco personas más, que serían dos concejales colorados, más dos referentes políticos de la ANR de la zona rural del distrito, y también la amenaza sería en contra de un policía. "Tenemos mucho miedo, no queremos aún que salga nuestro nombre, va a golpear muy fuerte a nuestras familias, no hay seguridad para hablar acá y no sabemos si denunciamos o dejamos la zona o nos llamamos a silencio", dijo uno de los que habría sido amenazado.

Según los afectados, las amenazas provienen de la clase política regional, en especial de los colorados que incluso contarían con el apoyo de miembros de otros partidos.

Recomendará mar "matón de nm"

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

00011

ASUNCION, 16 DE DICIEMBRE DE 2015

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

COPIA

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS EN LA RCA DEL PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES.

En fecha 23 de noviembre ppdo, nota mesa de entrada Nº 29051-15A, habíamos solicitado prorroga por 40 dias, por las precipitaciones acaecidas entre el periodo de tiempo transcurrido entre las fechas 18 de setiembre al 18 de noviembre, y aun a la fecha aguardamos respuesta sobre la misma.

Este es el momento que entre la fecha 18 de noviembre en adelante hasta hoy , **el Fenómeno Natural del Niño** ya afectó a todo el norte del país y otras regiones, causando estragos en la localidades afectadas , de todo tipo, hecho que repercute severamente en el cumplimiento del plazo de terminación de nuestro Contrato.

Es de público conocimiento que la ruta III ha sufrido percance catastrófico, el puente sobre el rio Ypané para acceder desde y hacia Horqueta se halla totalmente fuera de servicio por el desborde del mismo, lo que hace imposible ejecutar en tiempo y forma las obras, no podemos acceder a Horqueta asentamiento Aleman Cue, si no fuera por el chaco y desde allí para acceder a Tacuaty Poty no se puede cruzar el rio y tampoco llegar por la ruta III que se halla en reparaciones, lo que hace que la provisión de materiales e insumos no llegue a dichas localidades, los costos de transporte y movilización de personal calificado no se pueden organizar por todo lo arriba mencionado, si bien hacemos todo lo posible, este inconveniente , no ayuda para trabajar como quisiéramos. Sencillamente no se puede.

Por todo lo expuesto apelamos a vuestro entendimiento y solicitamos en estricta justicia, la aplicación del ARTICULO 14 del Contrato , SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS , hasta tanto se vislumbren mejoramientos en las inclemencias naturales, la bajante del rio y la reparación de la ruta, ya que no se puede solamente porque llueve aplicar las prórrogas, porque aunque hoy no las haya , no podremos llevar adelante las obras ya no solamente por las afectaciones de las cantidades de mm, caído, sino porque inclusive en esta región se ha DECLARADO EMERGENCIA NACIONAL.

Sin otro particular, aprovecho para saludarles atentamente.

ING. ANTONIO CABRERA B.

Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat "SENAVITAT"
MESA DE ENTRADA
Nº 30295-15 A

Mesa de Entrada
SENAVITAT

ayor Martinez Tel./Fax: 420 692 email: antocabr@rieder.net.py

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

ASUNCION, 16 de Diciembre de 2015.

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS EN LA RCA DEL PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES.

En fecha 23 de noviembre pasado, nota mesa de entrada Nº 29051-15A, habíamos solicitado prorroga por 40 días, por las precipitaciones acaecidas entre el periodo de tiempo transcurrido entre las fechas 18 de setiembre al 18 de noviembre, y aun a la fecha aguardamos respuesta sobre la misma.

Este es el momento que entre la fecha 18 de noviembre en adelante hasta hoy , **el Fenómeno Natural del Niño** ya afectó a todo el norte del país y otras regiones, causando estragos en la localidades afectadas , de todo tipo, hecho que repercute severamente en el cumplimiento del plazo de terminación de nuestro Contrato.

Es de público conocimiento que la ruta III ha sufrido percance catastrófico, el puente sobre el rio Ypané para acceder desde y hacia Horqueta se halla totalmente fuera de servicio por el desborde del mismo, lo que hace imposible ejecutar en tiempo y forma las obras, no podemos acceder a Horqueta asentamiento Alemán Cue, si no fuera por el chaco y desde allí para acceder a Tacuati Poty no se puede cruzar el rio y tampoco llegar por la ruta III que se halla en reparaciones, lo que hace que la provisión de materiales e insumos no llegue a dichas localidades, los costos de transporte y movilización de personal calificado no se pueden organizar por todo lo arriba mencionado, si bien hacemos todo lo posible, este inconveniente , no ayuda para trabajar como quisiéramos. Sencillamente no se puede.

Por todo lo expuesto apelamos a vuestro entendimiento y solicitamos en estricta justicia, la aplicación del ARTICULO 14 del Contrato , SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS , hasta tanto se vislumbren mejoramientos en las inclemencias naturales, la bajante del rio y la reparación de la ruta, ya que no se puede solamente porque llueve aplicar las prórrogas, porque aunque hoy no las haya , no podremos llevar adelante las obras ya no solamente por las afectaciones de las cantidades de mm, caído, sino porque inclusive en esta región se ha DECLARADO EMERGENCIA NACIONAL.

Igualmente, por todo lo expuesto, adjuntamos reprogramación del cronograma de obras en ambas localidades para su estudio y aprobación, siempre y cuando mejore las condiciones climáticas y se den las condiciones para el cumplimiento del mismo.-

Aprovecho para saludarles atentamente.

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat "SENAVITAT"

MESA DE ENTRAD

Expediente N°: 00404-16 A

Solicitante:

ING. CIVIL ANTONIO CABRERA B

Concepto:

SOLICITA LA APLICACION 14 DEL CONTRA

Fecha/Hora: 06/01/16 13:49

Por Mesa de Entrada
Mesa de Entrada
SENAVITAT

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil
ING. ANTONIO CABRERA B.

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Mayor Machuca Tel. Fax: 420 662 email: antocabr@rieder.net.py

ANTONIO RAFAEL CABRERA BUR
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat "SENAVITAT"

000012

MESA DE ENTRAD

Expediente N°: 01702-16 A

Solicitante:
ING. ANTONIO R. CABRERA. B.

Concepto:
SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO CONTR.

Fecha/Hora: 26/01/16 12:11

María Elena Sandoval G. Entrada
Mesa de Entrada
Original SENAVITAT

ASUNCION, 26 de ENERO DE 2016

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIE PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES

POR LA PRESENTE SOLICTAMOS AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL POR AFECTACION Y FALTA DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS DE ACUERDO AL SIGUENTE

- *EN TACUATI POTY*

LLUVIAS Y AFECTACION ENTRE EL 19/09/2015 AL 23/11/2015; 18 Y 17 DIAS RESPECTIVAMENTE

FALTA DE ACCESO DESDE EL 24/11/2015 AL 18/01/2016 TENEMOS 55 DIAS

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 18+17+55 = 90 DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006- 08/01/2016

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *08/01/2016+90= **07/04/2016***

- *EN ALEMAN CUE*

LLUVIAS Y AFECTACION ENTRE EL 20/09/2015 AL 31/12/2015; 37 Y 41 DIAS RESPECTIVAMENTE

FALTA DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS Y CIERRE DE RUTA III; 5 DIAS

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 37+41+5 = 83 DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006 – 30/11/2015

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *30/11/2015+83=**21/02/2016***

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDO ATENTAMENTE.

OBSERVACIONES:

1. *ADJUNTAMOS SOLICITUDES ANTERIORES CON LAS DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE LO SOLICITADO.*
2. *ESTA SOLICITUD ES UN RESUMEN ACTUALIZADO DE LO ANTERIORMENTE PRESENTADO.*
3. *ADJUNTAMOS CRONOGRAMA DE OBRAS REPROGRAMADO EN BASE A LO SOLICITADO*
4. *ADJUNTAMOS DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA QUE RESPALDA ESTA SOLICITUD*

ING. ANTONIO R. CABRERA B.

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

De las Heras 1317 y Mayor Martínez Tel./Fax: 420 692 email: antocabr@rieder.net.py

ANTONIO RAFAEL CABRERA B.
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

000014 Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat "SENAVITAT"

MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 02819-16 A

Solicitante:
ING. ANTONIO R. CABRERA B.

Concepto:
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL EN CARACTER DE URGIM

Fecha/Hora: 16/02/16 11:02

Mesa de Entrada
Original SENAVITAT

ASUNCION, 16 de Febrero DE 2016

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAI PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL EN CARÁCTER DE URGIMIENTO POR MOTIVOS DE LLUVIA, AFECTACION Y FALTA DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS DE ACUERDO AL SIGUENTE RESUMEN:

ACTUALIZACION AL 31/01/2016 DE LO YA SOLICITADO EN FECHA 26/01/2016

- *EN TACUATI POTY*

31/01/2016 21 19

LLUVIAS Y AFECTACION ENTRE EL 19/09/2015 AL 23/11/2015 18 Y 17 DIAS RESPECTIVAMENTE

FALTA DE ACCESO DESDE EL 24/11/2015 AL 18/01/2016 TENEMOS 55 DIAS

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 21+19+55 = 95 DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006- 08/01/2016

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *08/01/2016+95=* ***12/04/2016***

- *EN ALEMAN CUE*

LLUVIAS Y AFECTACION ENTRE EL 20/09/2015 AL 31/12/2015; 37 Y 41 DIAS RESPECTIVAMENTE

FALTA DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS Y CIERRE DE RUTA III; 5 DIAS

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 46+48+5 = 99 DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006 – 30/11/2015

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *30/11/2015+99=**08/03/2016***

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDO ATENTAMENTE.

OBSERVACIONES:

1. *ADJUNTAMOS SOLICITUDES ANTERIORES CON LAS DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE LO SOLICITADO.*
2. *ESTA SOLICITUD ES UN RESUMEN ACTUALIZADO DE LO ANTERIORMENTE PRESENTADO.*
3. *ADJUNTAMOS CRONOGRAMA DE OBRAS REPROGRAMADO EN BASE A LO SOLICITADO*
4. *ADJUNTAMOS DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA QUE RESPALDA ESTA SOLICITUD*
5. *PLANILLA DE LLUVIAS Y AFECTACION DE ACUERDO A REGISTRO DE LA DINAC*

ING. ANTONIO R. CABRERA B.

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

De las Ilanas 1317 y Mayor Martinez Tel./Fax: 420 692 email: antocabr@rieder.net.py

000015

Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat "SENAVITAT"

MESA DE ENTRADA

Expediente N°: 05549-16 A

Solicitante: ING. CIVIL ANTONIO R. CABRERA B

Concepto: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO LPN 08/14

Fecha/Hora: 07/04/16 11:51

MESA DE ENTRADA SENAVITAT

Original

ANTONIO RAFAEL CABRERA BL
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

ASUNCION, 07de Abril DE 2016

SEÑORES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

MINISTRA ING. SOLEDAD NUÑEZ

PRESENTE.

REF. LPN Nº 08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAM. PARAGUAY CONTRATO Nº 105/14

ATT. SEMBRANDO OPORTUNIDADES

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL ***EN CARÁCTER DE URGIMIENTO*** *POR MOTIVOS DE LLUVIA, AFECTACION Y FALTA DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS DE ACUERDO AL SIGUENTE RESUMEN:*

ACTUALIZACION AL 31/03/2016 DE LO YA SOLICITADO EN FECHA 16/02/2016 EXPEDIENTE N° 02819-16A

- ***EN TACUATI POTY***

LLUVIAS Y AFECTACION FEBRERO Y MARZO/2016; 14 Y 7 DIAS RESPECTIVAMENTE

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 14+7 = 21 DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006- 08/01/2016

PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *EN FECHA 16/02/2016=* 12/04/2016

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *12/04/2016+21 DIAS=* ***03/05/2016***

- ***EN ALEMAN CUE***

LLUVIAS Y AFECTACION FEBRERO Y MARZO/2016; 19 Y 9 DIAS RESPECTIVAMENTE

TOTAL DE DIAS SIN POSIBILIDAD DE TRABAJAR 19+9 =28DIAS

FINAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN CONVENIO MODIF Nº 006 – 30/11/2015

PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *EN FECHA 16/02/2016=08/03/2016*

NUEVO PLAZO DE FINALIZACION SOLICITADO *08/03/2016+28 DIAS=* ***05/04/2016***

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDO ATENTAMENTE.

OBSERVACIONES:

1. ***ESTA SOLICITUD ES UN RESUMEN ACTUALIZADO DE LO ANTERIORMENTE PRESENTADO.***
2. ***ADJUNTAMOS CRONOGRAMA DE OBRAS REPROGRAMADO EN BASE A LO SOLICITADO***
3. ***PLANILLA DE LLUVIAS Y AFECTACION DE ACUERDO A REGISTRO DE LA DINAC***

ING. ANTONIO R. CABRERA B.

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

De las Heras 1317 y Mayor Martínez Tel./Fax: 420 692 email: antocabr@rieder.net.py

Obra: "CONSTRUCCION DE VIVIENDASDE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS EN LA RCA. DELPARAGUAYCONTRATO N° 105/14" ALEMAN CUE

ING. ANTONIO CABRERA

INFORME DE LLUVIA Y AFECTACION - FALTA DE ACCESO PARA AMPLIACION Y REPROGRAMACIONES DE PLAZOS

	2016					
	FEBRERO		MARZO			
DIAS	Afectacion	DINAC	Afectacion	DINAC		
1		31,4		31,0		
2		10,3		0,0		
3	1,0	4,2		0,0		
4		0,0		0,0		
5		19,7		0,0		
6		0,8- LO		0,0		
7	1,0	0,0		0,0		
8		0,0		15,7		
9		0,0		7,2		
10		18,0	1,0	0,0		
11	1,0	0,0		0,0		
12		0,0		0,0		
13		0,0		0,0		
14		0,0		0,0		
15		2,2		0,0		
16		2,4		0,0		
17		0,0		0,0		
18		0,0		0,0		
19		0,0		LO		
20		53,4		0,0		
21	1,0	0,0		LO		
22		0,7 -LO	1,0	0,0		
23		6,0		34,4		
24	1,0	0,0		29,4		
25		0,0		LO		
26		0,0	1,0	0,0		
27		51,9		0,0		
28		46,8		0,0		
29		5,0		0,0		
30	1,0			0,0		
31				0,0	TOTAL DIAS	TOTAL DIAS
SUBTOTAL DIAS DE LLUVIA SEGU N DINAC-LIBRO DE OBRAS		11		8	19,0	
SUBTOTAL DIAS HUMEDAD SIN ACTIVIDAD - AFECTACION	6,0		3,0		9,0	
SIN ACCESO A OBRA					0	28

08/03/2016
28
05/04/2016

00014

Obra: "CONSTRUCCION DE VIVIENDASDE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS EN LA RCA. DELPARAGUAYCONTRATO N° 105/14" TACUATI POTY

ING. ANTONIO CABRERA

INFORME DE LLUVIA Y AFECTACION - FALTA DE ACCESO PARA AMPLIACION Y REPROGRAMACIONES DE PLAZOS

2016						
	FEBRERO		MARZO			
DIAS	Afectacion	DINAC	Afectacion	DINAC		
1		3,0		20,4		
2		14,7		LO		
3		10,4	1,0	0,0		
4	1,0	6,0		0,0		
5		2,1		0,0		
6		0,0		0,0		
7		0,0		0,0		
8		0,0		13,5		
9		16,4		8,1		
10		12,7		0,0		
11	1,0	0,0		LO		
12		0,0		LO		
13		0,0	1,0	0,0		
14		0,0		0,0		
15		0,0		0,0		
16		6,1		0,0		
17		0,0		0,0		
18		0,0		0,0		
19		0,0		0,0		
20		0,0		0,0		
21		0,0		0,0		
22		LO		0,0		
23		14,9		17,5		
24	1,0	0,0		12,8		
25		0,0	1,0	T		
26		0,0		0,0		
27		18,5		0,0		
28		50,4		0,0		
29	1,0	0,0		0,0		
30				0,0		
31				0,0	TOTAL DIAS	TOTAL DIAS
SUBTOTAL DIAS DE LLUVIA SEGU N DINAC LIBRO DE OBRAS		8,0		6,0	14,0	
SUBTOTAL DIAS HUMEDAD SIN ACTIVIDAD - AFECTACION	4,0		3,0		7,0	
SIN ACCESO A OBRA					0	21

12/04/2016
21
03/05/2016

000017

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS

CURVA DE CERTIFICACION DE CONSTRUCCION - TACUATI POTY- 1RA. ORDEN DE SERVICIO- AMPLIADO Y REPROGRAMADO

Datos Contractuales

Monto Total 5.108.587.760
80 VR-2D
2 CARTELS

FECHA: 16/02/2016

Certificado de Obras		Avance Previsto		Certificación Prevista			Avance Ejecutado		Certificación Ejecutada		
N°	Mes	Mensual	Acumulado	Semanal	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Menusal	Acumulado
	SEM1	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561
MAY/JUN	SEM2	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.121	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.122
	SEM3	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.682	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.683
1	SEM4	0,98%	3,93%	50.224.561	200.898.242	200.898.242	0,98%	3,93%	50.224.561	200.898.244	200.898.244
	SEM5	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.323	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.325
JUN/JUL	SEM6	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.404	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.406
	SEM7	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.484	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.487
2	SEM8	1,40%	9,52%	71.408.081	285.632.323	486.530.565	1,40%	9,52%	71.408.081	285.632.324	486.530.568
	SEM9	3,75%	13,27%	191.572.041		678.102.606	4,38%	13,90%	223.566.827		710.097.395
JUL/AGO	SEM10	3,75%	17,02%	191.572.041		869.674.647	4,38%	18,28%	223.566.827		933.664.222
	SEM11	3,75%	20,77%	191.572.041		1.061.246.688	4,38%	22,65%	223.566.827		1.157.231.048
3	SEM12	3,75%	24,52%	191.572.041	766.288.164	1.252.818.729	4,38%	27,03%	223.566.827	894.267.307	1.380.797.875
	SEM13	2,79%	27,31%	142.500.000		1.395.318.729	2,18%	29,21%	111.567.324		1.492.365.199
AGO/SET	SEM14	2,79%	30,10%	142.500.000		1.537.818.729	2,18%	31,40%	111.567.324		1.603.932.522
	SEM15	2,79%	32,89%	142.500.000		1.680.318.729	2,18%	33,58%	111.567.324		1.715.499.846
4	SEM16	2,79%	35,68%	142.500.000	570.000.000	1.822.818.729	2,18%	35,76%	111.567.324	446.269.294	1.827.067.169
	SEM17	3,67%	39,35%	187.500.000		2.010.318.729	3,65%	39,42%	186.674.558		2.013.741.727
SET/OCT	SEM18	3,67%	43,02%	187.500.000		2.197.818.729	3,65%	43,07%	186.674.558		2.200.416.286
	SEM19	3,67%	46,69%	187.500.000		2.385.318.729	3,65%	46,73%	186.674.558		2.387.090.844
5	SEM20	3,67%	50,36%	187.500.000	750.000.000	2.572.818.729	3,65%	50,38%	186.674.558	746.698.233	2.573.765.402
	SEM21	3,67%	54,03%	187.500.000		2.760.318.729	3,87%	54,25%	197.632.063		2.771.397.465
OCT/NOV	SEM22	3,67%	57,70%	187.500.000		2.947.818.729	3,87%	58,12%	197.632.063		2.969.029.529
	SEM23	3,67%	61,37%	187.500.000		3.135.318.729	3,87%	61,99%	197.632.063		3.166.661.592
6	SEM24	3,67%	65,04%	187.500.000	750.000.000	3.322.818.729	3,87%	65,86%	197.632.063	790.528.253	3.364.293.655
	SEM25	0,20%	65,24%	10.250.000		3.333.068.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
NOV/DIC	SEM26	0,20%	65,45%	10.250.000		3.343.318.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
	SEM27	0,20%	65,65%	10.250.000		3.353.568.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
7	SEM28	0,20%	65,85%	10.250.000	41.000.000	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM29	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
DIC/ENE	SEM30	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
2016	SEM31	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
8	SEM32	0,00%	65,85%	0	0	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM33	1,47%	67,31%	75.000.000		3.438.818.729					
ENE/FEB	SEM34	1,47%	68,78%	75.000.000		3.513.818.729					
2016	SEM35	1,47%	70,25%	75.000.000		3.588.818.729					
9	SEM36	1,47%	71,72%	75.000.000	300.000.000	3.663.818.729					
	SEM37	2,45%	74,17%	125.000.000		3.788.818.729					
FEB/MAR	SEM38	2,45%	76,61%	125.000.000		3.913.818.729					
2016	SEM39	2,45%	79,06%	125.000.000		4.038.818.729					
10	SEM40	2,45%	81,51%	125.000.000	500.000.000	4.163.818.729					
MAR/ABR	SEM41	9,25%	90,75%	472.384.516		4.636.203.245					
11	SEM42	9,25%	100,00%	472.384.516	944.769.031	5.108.587.760					
SUMATORIA		100,00%		5.108.587.760							

0

Cronog. Fisico - Financiero (Montos)

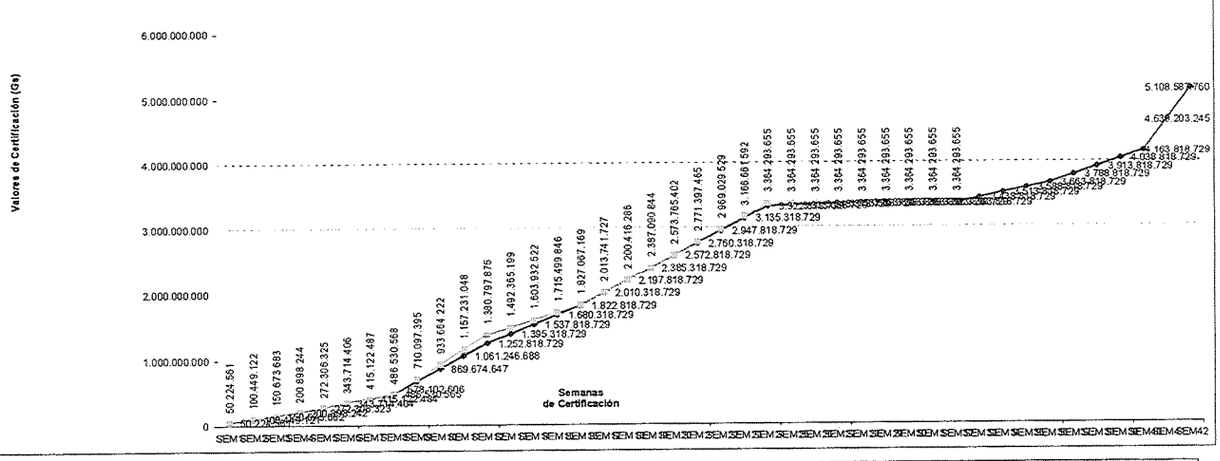

Cronog. Fisico - Financiero (Porcentajes)

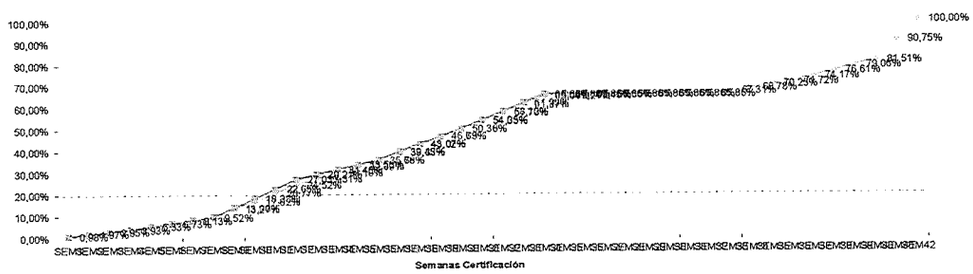

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS

CURVA DE CERTIFICACION DE CONSTRUCCION - ALEMAN CUE- 1RA. ORDEN DE SERVICIO- AMPLIADO Y REPROGRAMADO

Datos Contractuales
Monto Total: 2.558.442.240
39- VR 2D
1 - VR 2D DISCAPACITADO
2- CARTELES

FECHA: 16/02/2016

Certificado de Obras		Avance Previsto		Certificación Prevista			Avance Ejecutado		Certificación Ejecutada		
N°	Mes	Semanal	Acumulado	Semanal	Mensual	Acumulado	Semanal	Acumulado	Semanal	Mensual	Acumulado
	SEM1	3,39%	3,39%	86.662.481		86.662.481	3,39%	3,39%	86.662.481		86.662.481
MAY/JUN	SEM2	3,39%	6,77%	86.662.481		173.324.962	3,39%	6,77%	86.662.481		173.324.962
	SEM3	3,39%	10,16%	86.662.481		259.987.443	3,39%	10,16%	86.662.481		259.987.442
1	SEM4	3,39%	13,55%	86.662.481	346.649.924	346.649.924	3,39%	13,55%	86.662.481	346.649.923	346.649.923
	SEM5	1,92%	15,47%	49.152.227		395.802.151	1,92%	15,47%	49.152.227		395.802.150
JUN/JUL	SEM6	1,92%	17,39%	49.152.227		444.954.377	1,92%	17,39%	49.152.227		444.954.377
	SEM7	1,92%	19,31%	49.152.227		494.106.604	1,92%	19,31%	49.152.227		494.106.604
2	SEM8	1,92%	21,23%	49.152.227	196.608.906	543.258.830	1,92%	21,23%	49.152.227	196.608.908	543.258.831
	SEM9	3,75%	24,98%	95.941.584		639.200.414	4,35%	25,58%	111.226.788		654.485.619
JUL/AGO	SEM10	3,75%	28,73%	95.941.584		735.141.998	4,35%	29,93%	111.226.788		765.712.408
	SEM11	3,75%	32,48%	95.941.584		831.083.582	4,35%	34,28%	111.226.788		876.939.196
3	SEM12	3,75%	36,23%	95.941.584	383.766.336	927.025.166	4,35%	38,62%	111.226.788	444.907.153	988.165.984
	SEM13	1,86%	38,09%	47.500.000		974.525.166	0,00%	38,62%	0		988.165.984
AGO/SET	SEM14	1,86%	39,95%	47.500.000		1.022.025.166	0,00%	38,62%	0		988.165.984
	SEM15	1,86%	41,80%	47.500.000		1.069.525.166	2,62%	41,24%	67.014.968		1.055.180.952
4	SEM16	1,86%	43,66%	47.500.000	190.000.000	1.117.025.166	2,62%	43,86%	67.014.968	134.029.935	1.122.195.919
	SEM17	1,47%	45,13%	37.500.000		1.154.525.166	1,47%	45,33%	37.519.758		1.159.715.677
SET/OCT	SEM18	1,47%	46,59%	37.500.000		1.192.025.166	1,47%	46,80%	37.519.758		1.197.235.434
	SEM19	1,47%	48,06%	37.500.000		1.229.525.166	1,47%	48,26%	37.519.758		1.234.755.192
5	SEM20	1,47%	49,52%	37.500.000	150.000.000	1.267.025.166	1,47%	49,73%	37.519.758	150.079.030	1.272.274.949
	SEM21	4,06%	53,58%	103.750.000		1.370.775.166	4,09%	53,81%	104.526.275		1.376.801.224
OCT/NOV	SEM22	4,06%	57,63%	103.750.000		1.474.525.166	4,09%	57,90%	104.526.275		1.481.327.498
	SEM23	4,06%	61,69%	103.750.000		1.578.275.166	4,09%	61,99%	104.526.275		1.585.853.773
6	SEM24	4,06%	65,74%	103.750.000	415.000.000	1.682.025.166	4,09%	66,07%	104.526.275	418.105.098	1.690.380.047
	SEM25	2,12%	67,86%	54.250.000		1.736.275.166	2,12%	68,19%	54.317.460		1.744.697.507
NOV/DIC	SEM26	2,12%	69,98%	54.250.000		1.790.525.166	2,12%	70,32%	54.317.460		1.799.014.968
	SEM27	2,12%	72,11%	54.250.000		1.844.775.166	2,12%	72,44%	54.317.460		1.853.332.428
7	SEM28	2,12%	74,23%	54.250.000	217.000.000	1.899.025.166	2,12%	74,56%	54.317.460	217.269.841	1.907.649.888
	SEM29	1,24%	75,47%	31.837.500		1.930.862.666	1,24%	75,81%	31.838.873		1.939.488.761
DIC/ENE	SEM30	1,24%	76,71%	31.837.500		1.962.700.166	1,24%	77,05%	31.838.873		1.971.327.633
2016	SEM31	1,24%	77,96%	31.837.500		1.994.537.666	1,24%	78,30%	31.838.873		2.003.166.506
8	SEM32	1,24%	79,20%	31.837.500	127.350.000	2.026.375.166	1,24%	79,54%	31.838.873	127.355.490	2.035.005.378
En/Feb	SEM33	2,54%	81,74%	65.000.000		2.091.375.166					
2016	SEM34	2,54%	84,28%	65.000.000		2.156.375.166					
	SEM35	2,54%	86,83%	65.000.000		2.221.375.166					
9	SEM36	2,54%	89,37%	65.000.000	260.000.000	2.286.375.166					
10 MARZ/2016	SEM37	10,63%	100,00%	272.067.074	272.067.074	2.558.442.240					
SUMATORIA		100,00%		2.558.442.240							
				0	0						532.067.074

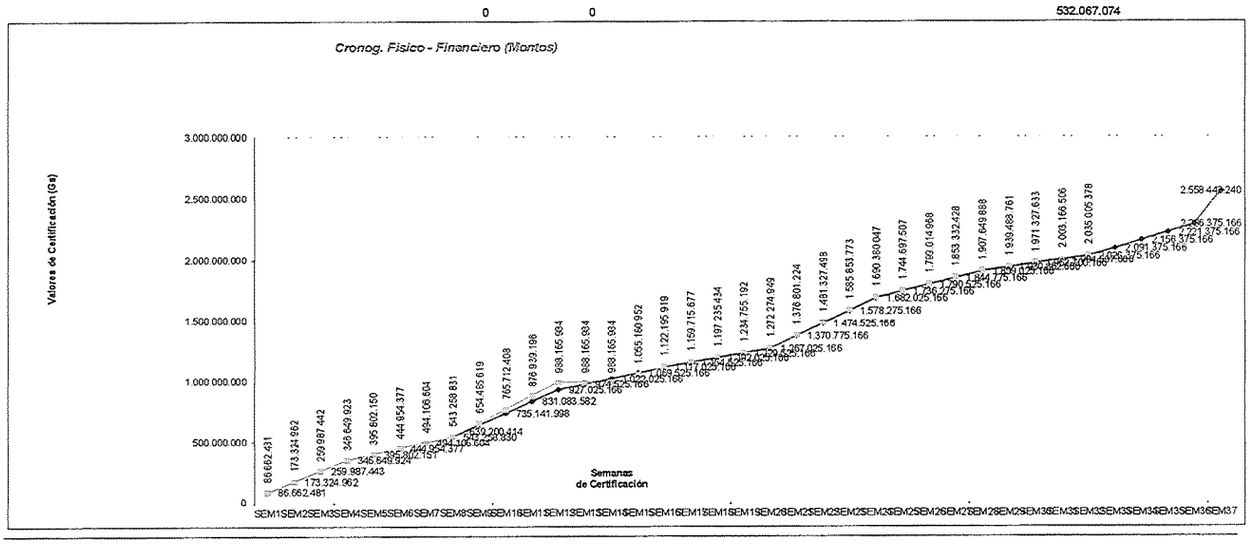

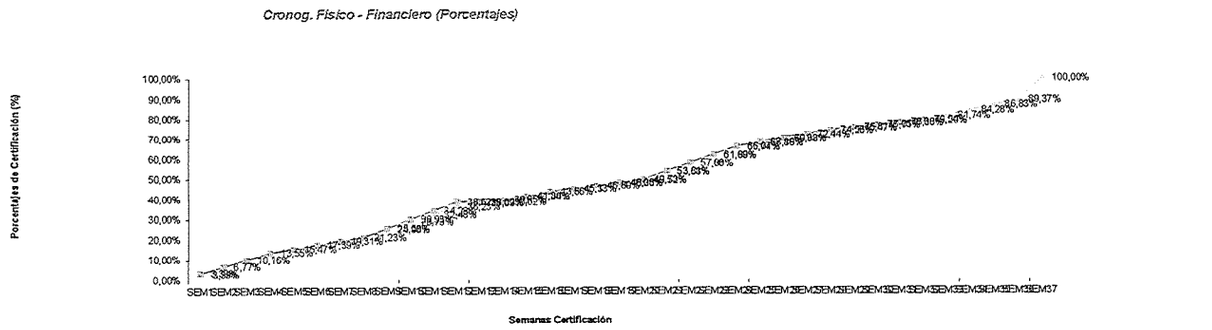

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS

CURVA DE CERTIFICACION DE CONSTRUCCION - TACUATI POTY- 1RA. ORDEN DE SERVICIO- AMPLIADO Y REPROGRAMADO

Datos Contractuales

Monto Total 5.108.587.760
80 VR-2D
2 CARTELS

FECHA: 07/04/2016

Certificado de Obras		Avance Previsto		Certificación Prevista			Avance Ejecutado		Certificación Ejecutada		
N°	Mes	Mensual	Acumulado	Semanal	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Menusal	Acumulado
	SEM1	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561
MAY/JUN	SEM2	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.121	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.122
	SEM3	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.682	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.683
1	SEM4	0,98%	3,93%	50.224.561	200.898.242	200.898.242	0,98%	3,93%	50.224.561	190.372.627	200.898.244
	SEM5	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.323	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.325
JUN/JUL	SEM6	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.404	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.406
	SEM7	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.484	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.487
2	SEM8	1,40%	9,52%	71.408.081	285.632.323	486.530.565	1,40%	9,52%	71.408.081	290.047.192	486.530.568
	SEM9	3,75%	13,27%	191.572.041		678.102.606	4,38%	13,90%	223.566.827		710.097.395
JUL/AGO	SEM10	3,75%	17,02%	191.572.041		869.674.647	4,38%	18,28%	223.566.827		933.664.222
	SEM11	3,75%	20,77%	191.572.041		1.061.246.688	4,38%	22,65%	223.566.827		1.157.231.048
3	SEM12	3,75%	24,52%	191.572.041	766.288.164	1.252.818.729	4,38%	27,03%	223.566.827	894.267.307	1.380.797.875
	SEM13	2,79%	27,31%	142.500.000		1.395.318.729	2,18%	29,21%	111.567.324		1.492.365.199
AGO/SET	SEM14	2,79%	30,10%	142.500.000		1.537.818.729	2,18%	31,40%	111.567.324		1.603.932.522
	SEM15	2,79%	32,89%	142.500.000		1.680.318.729	2,18%	33,58%	111.567.324		1.715.499.846
4	SEM16	2,79%	35,68%	142.500.000	570.000.000	1.822.818.729	2,18%	35,76%	111.567.324	446.269.294	1.827.067.169
	SEM17	3,67%	39,35%	187.500.000		2.010.318.729	3,65%	39,42%	186.674.558		2.013.741.727
SET/OCT	SEM18	3,67%	43,02%	187.500.000		2.197.818.729	3,65%	43,07%	186.674.558		2.200.416.286
	SEM19	3,67%	46,69%	187.500.000		2.385.318.729	3,65%	46,73%	186.674.558		2.387.090.844
5	SEM20	3,67%	50,36%	187.500.000	750.000.000	2.572.818.729	3,65%	50,38%	186.674.558	745.708.583	2.573.765.402
	SEM21	3,67%	54,03%	187.500.000		2.760.318.729	3,87%	54,25%	197.632.063		2.771.397.465
OCT/NOV	SEM22	3,67%	57,70%	187.500.000		2.947.818.729	3,87%	58,12%	197.632.063		2.969.029.529
	SEM23	3,67%	61,37%	187.500.000		3.135.318.729	3,87%	61,99%	197.632.063		3.166.661.592
6	SEM24	3,67%	65,04%	187.500.000	750.000.000	3.322.818.729	3,87%	65,86%	197.632.063	778.744.833	3.364.293.655
	SEM25	0,20%	65,24%	10.250.000		3.333.068.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
NOV/DIC	SEM26	0,20%	65,45%	10.250.000		3.343.318.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
	SEM27	0,20%	65,65%	10.250.000		3.353.568.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
7	SEM28	0,20%	65,85%	10.250.000	41.000.000	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM29	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
DIC/ENE	SEM30	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
2016	SEM31	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
8	SEM32	0,00%	65,85%	0	0	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM33	1,47%	67,31%	75.000.000		3.438.818.729	2,06%	68,92%	105.297.940		3.469.293.655
ENE/FEB	SEM34	1,47%	68,78%	75.000.000		3.513.818.729	2,06%	69,98%	105.297.940		3.574.889.535
2016	SEM35	1,47%	70,25%	75.000.000		3.588.818.729	2,06%	72,04%	105.297.940		3.680.187.475
9	SEM36	1,47%	71,72%	75.000.000	300.000.000	3.663.818.729	2,06%	74,10%	105.297.940	421.191.761	3.785.485.415
	SEM37	0,69%	72,40%	35.000.000		3.698.818.729	0,71%	74,81%	36.374.460		3.821.859.875
FEB/MAR	SEM38	0,69%	73,09%	35.000.000		3.733.818.729	0,71%	75,53%	36.374.460		3.858.234.336
2016	SEM39	0,69%	73,77%	35.000.000		3.768.818.729	0,71%	76,24%	36.374.460		3.894.608.796
10	SEM40	0,69%	74,46%	35.000.000	140.000.000	3.803.818.729	0,71%	76,95%	36.374.460	145.497.841	3.930.983.256
MAR/ABR	SEM41	1,86%	76,32%	95.000.000		3.898.818.729	0,00%				
2016	SEM42	1,86%	78,18%	95.000.000		3.993.818.729	0,00%				
	SEM43	1,86%	80,04%	95.000.000		4.088.818.729	0,00%				
11	SEM44	1,86%	81,90%	95.000.000	380.000.000	4.183.818.729	0,00%				
ABR/MAY	SEM45	4,53%	86,42%	231.192.258		4.415.010.987	0,00%				
2016	SEM46	4,53%	90,95%	231.192.258		4.646.203.245	0,00%				
	SEM47	4,53%	95,47%	231.192.258		4.877.395.502	0,00%				
12	SEM48	4,53%	100,00%	231.192.258	924.769.031	5.108.587.760	0,00%				
SUMATORIA		86,42%		5.108.587.760							

0

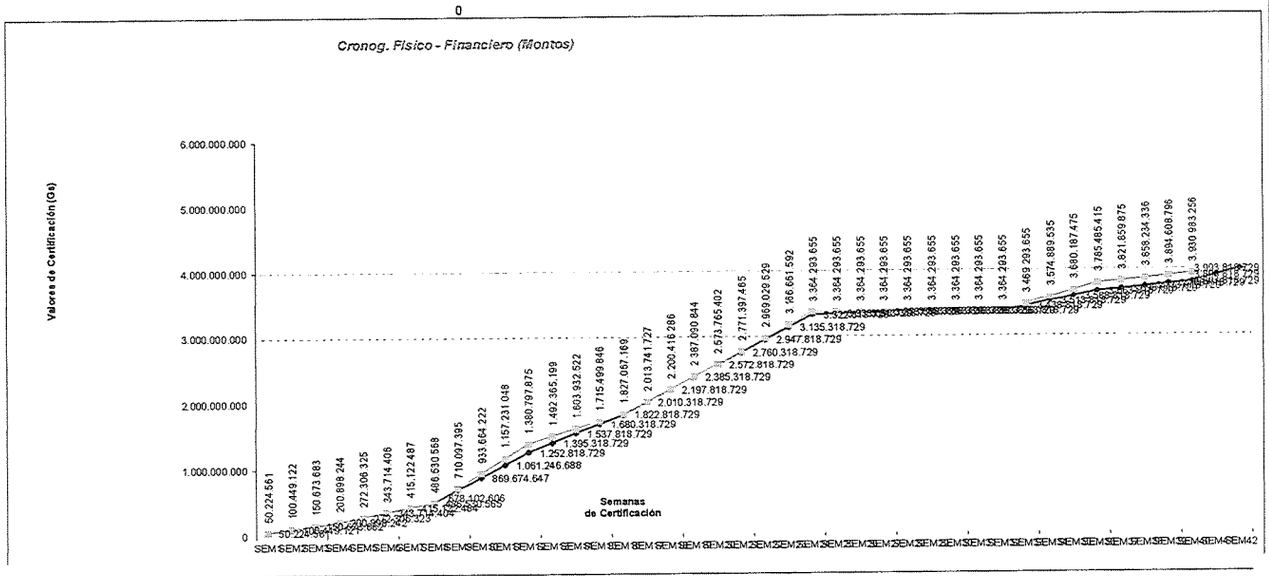

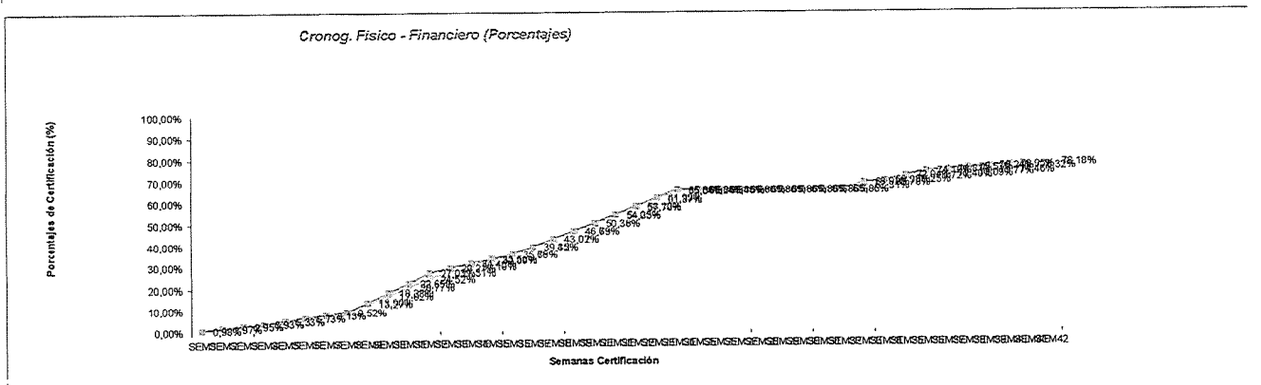

1

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS

CURVA DE CERTIFICACION DE CONSTRUCCION - TACUATI POTY- 1RA. ORDEN DE SERVICIO- AMPLIADO Y REPROGRAMADO

Datos Contractuales

Monto Total 5.108.587.760
80 VR-2D
2 CARTELS

FECHA: 26/01/2016

Certificado de Obras		Avance Previsto		Certificación Prevista			Avance Ejecutado		Certificación Ejecutada		
N°	Mes	Mensual	Acumulado	Semanal	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Menusal	Acumulado
	SEM1	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561	0,98%	0,98%	50.224.561		50.224.561
MAY/JUN	SEM2	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.121	0,98%	1,97%	50.224.561		100.449.122
	SEM3	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.682	0,98%	2,95%	50.224.561		150.673.683
1	SEM4	0,98%	3,93%	50.224.561	200.898.242	200.898.242	0,98%	3,93%	50.224.561	200.898.244	200.898.244
	SEM5	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.323	1,40%	5,33%	71.408.081		272.306.325
JUN/JUL	SEM6	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.404	1,40%	6,73%	71.408.081		343.714.406
	SEM7	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.484	1,40%	8,13%	71.408.081		415.122.487
2	SEM8	1,40%	9,52%	71.408.081	285.632.323	486.530.565	1,40%	9,52%	71.408.081	285.632.324	486.530.568
	SEM9	3,75%	13,27%	191.572.041		678.102.606	4,38%	13,90%	223.566.827		710.097.395
JUL/AGO	SEM10	3,75%	17,02%	191.572.041		869.674.647	4,38%	18,28%	223.566.827		933.664.222
	SEM11	3,75%	20,77%	191.572.041		1.061.246.688	4,38%	22,65%	223.566.827		1.157.231.048
3	SEM12	3,75%	24,52%	191.572.041	766.288.164	1.252.818.729	4,38%	27,03%	223.566.827	894.267.307	1.380.797.875
	SEM13	2,79%	27,31%	142.500.000		1.395.318.729	2,18%	29,21%	111.567.324		1.492.365.199
AGO/SET	SEM14	2,79%	30,10%	142.500.000		1.537.818.729	2,18%	31,40%	111.567.324		1.603.932.522
	SEM15	2,79%	32,89%	142.500.000		1.680.318.729	2,18%	33,58%	111.567.324		1.715.499.846
4	SEM16	2,79%	35,68%	142.500.000	570.000.000	1.822.818.729	2,18%	35,76%	111.567.324	446.269.294	1.827.067.169
	SEM17	3,67%	39,35%	187.500.000		2.010.318.729	3,65%	39,42%	186.674.558		2.013.741.727
SET/OCT	SEM18	3,67%	43,02%	187.500.000		2.197.818.729	3,65%	43,07%	186.674.558		2.200.416.286
	SEM19	3,67%	46,69%	187.500.000		2.385.318.729	3,65%	46,73%	186.674.558		2.387.090.844
5	SEM20	3,67%	50,36%	187.500.000	750.000.000	2.572.818.729	3,65%	50,38%	186.674.558	746.698.233	2.573.765.402
	SEM21	3,67%	54,03%	187.500.000		2.760.318.729	3,87%	54,25%	197.632.063		2.771.397.465
OCT/NOV	SEM22	3,67%	57,70%	187.500.000		2.947.818.729	3,87%	58,12%	197.632.063		2.969.029.529
	SEM23	3,67%	61,37%	187.500.000		3.135.318.729	3,87%	61,99%	197.632.063		3.166.661.592
6	SEM24	3,67%	65,04%	187.500.000	750.000.000	3.322.818.729	3,87%	65,86%	197.632.063	790.528.253	3.364.293.655
	SEM25	0,20%	65,24%	10.250.000		3.333.068.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
NOV/DIC	SEM26	0,20%	65,45%	10.250.000		3.343.318.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
	SEM27	0,20%	65,65%	10.250.000		3.353.568.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
7	SEM28	0,20%	65,85%	10.250.000	41.000.000	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM29	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
DIC/ENE	SEM30	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
2016	SEM31	0,00%	65,85%	0		3.363.818.729	0,00%	65,86%	0		3.364.293.655
8	SEM32	0,00%	65,85%	0	0	3.363.818.729	0,00%	65,86%	0	0	3.364.293.655
	SEM33	3,64%	69,49%	186.192.258		3.550.010.987					
ENE/FEB	SEM34	3,64%	73,14%	186.192.258		3.736.203.245					
2016	SEM35	3,64%	76,78%	186.192.258		3.922.395.502					
9	SEM36	3,64%	80,43%	186.192.258	744.769.031	4.108.587.760					
	SEM37	4,89%	85,32%	250.000.000		4.358.587.760					
MAR/ABR	SEM38	4,89%	90,21%	250.000.000		4.608.587.760					
2016	SEM39	4,89%	95,11%	250.000.000		4.858.587.760					
10	SEM40	4,89%	100,00%	250.000.000	1.000.000.000	5.108.587.760					
SUMATORIA		100,00%		5.108.587.760							

Cronog. Fisico - Financiero (Montos)

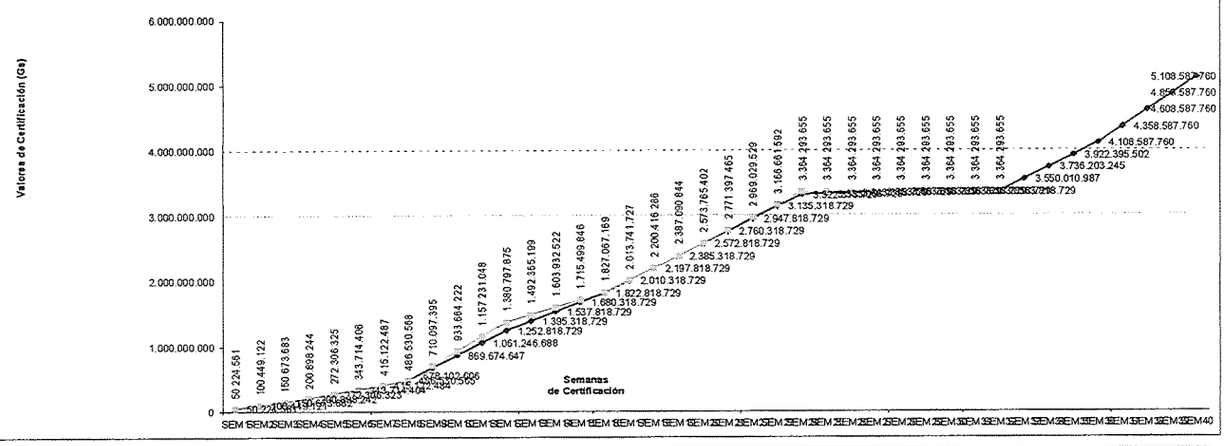
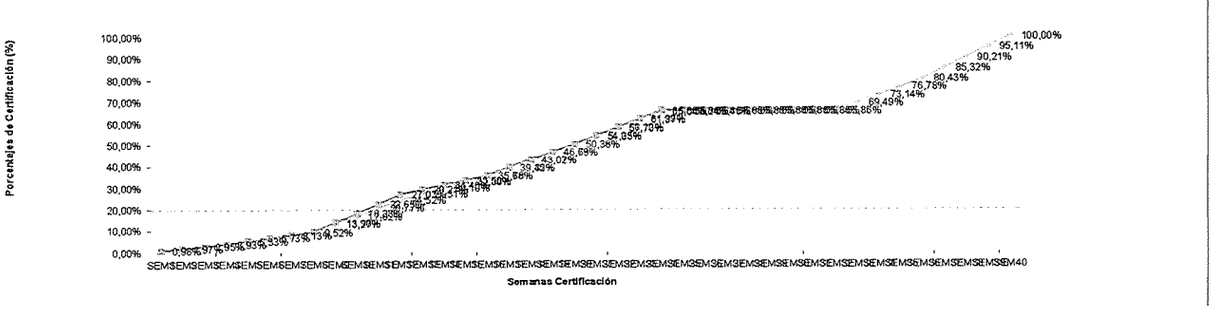
Cronog. Fisico - Financiero (Porcentajes)
