Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 05 de Marzo de 2021.-

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS**, correspondiente al mes de **FEBRERO/2021 (del 01 al 28).-**

Se presenta en anexo:
- Planilla general de días de lluvia y sus efectos correspondiente a las 4 Instituciones Educativas.-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia y sus efectos)
- Memoria respaldatoria de lluvia y sus efectos con fotografías.-

Fundamentado en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicito por el mes de **Febrero/2021** (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC): **12 (DOCE) DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS EFECTOS.-**

Atentamente.-

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 1267
Sector: SARA.
DIA 05 | 03 | 2021. | HORA 13:57

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Propietario

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC
CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES
CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO

PLANILLA GENERAL DE DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS (según DINAC y libros de obra)
MES DE FEBRERO 2021

FECHA	ESC N° 592-SAN JUAN BOSCO		ESC N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS		ESC N° 568-LAS RESIDENTAS		ESC N° 182-DR. ANTOLIANO GARCETE		TOTAL DE DIAS DEL MES	
	DPTO. DE CONCEPCION		DPTO. DE CAAGUAZU		DPTO. DE SAN PEDRO		DPTO. DE PDTE. HAYES			
	lluvia	efecto	lluvia	efecto	lluvia	efecto	lluvia	efecto	lluvia	efecto
01/02/21			1		1		1		1	
02/02/21			1			1		1	1	
03/02/21	1			1	1				1	
04/02/21		1		1		1				1
05/02/21										
06/02/21										
07/02/21										
08/02/21										
09/02/21										
10/02/21	1		1				1		1	
11/02/21		1		1				1		
12/02/21							1		1	
13/02/21			1					1	1	
14/02/21	1			1					1	
15/02/21		1								1
16/02/21										
17/02/21										
18/02/21										
19/02/21										
20/02/21										
21/02/21										
22/02/21										
23/02/21										
24/02/21							1		1	
25/02/21								1		1
26/02/21										
27/02/21										
28/02/21										
TOTAL	**3**	**3**	**4**	**4**	**2**	**2**	**4**	**4**	8	4

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	12

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE FEBRERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/02/21		
02/02/21		
03/02/21	1	
04/02/21		1
05/02/21		
06/02/21		
07/02/21		
08/02/21		
09/02/21		
10/02/21	1	
11/02/21		1
12/02/21		
13/02/21		
14/02/21	1	
15/02/21		1
16/02/21		
17/02/21		
18/02/21		
19/02/21		
20/02/21		
21/02/21		
22/02/21		
23/02/21		
24/02/21		
25/02/21		
26/02/21		
27/02/21		
28/02/21		
TOTAL	**3**	**3**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	6

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE FEBRERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/02/21	1	
02/02/21	1	
03/02/21		1
04/02/21		1
05/02/21		
06/02/21		
07/02/21		
08/02/21		
09/02/21		
10/02/21	1	
11/02/21		1
12/02/21		
13/02/21	1	
14/02/21		1
15/02/21		
16/02/21		
17/02/21		
18/02/21		
19/02/21		
20/02/21		
21/02/21		
22/02/21		
23/02/21		
24/02/21		
25/02/21		
26/02/21		
27/02/21		
28/02/21		
TOTAL	**4**	**4**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	8

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE FEBRERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/02/21	1	
02/02/21		1
03/02/21	1	
04/02/21		1
05/02/21		
06/02/21		
07/02/21		
08/02/21		
09/02/21		
10/02/21		
11/02/21		
12/02/21		
13/02/21		
14/02/21		
15/02/21		
16/02/21		
17/02/21		
18/02/21		
19/02/21		
20/02/21		
21/02/21		
22/02/21		
23/02/21		
24/02/21		
25/02/21		
26/02/21		
27/02/21		
28/02/21		
TOTAL	**2**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	4

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIANO GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE FEBRERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/02/21	1	
02/02/21		1
03/02/21		
04/02/21		
05/02/21		
06/02/21		
07/02/21		
08/02/21		
09/02/21		
10/02/21	1	
11/02/21		1
12/02/21	1	
13/02/21		1
14/02/21		
15/02/21		
16/02/21		
17/02/21		
18/02/21		
19/02/21		
20/02/21		
21/02/21		
22/02/21		
23/02/21		
24/02/21	1	
25/02/21		1
26/02/21		
27/02/21		
28/02/21		
TOTAL	**4**	**4**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	8

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,5										
3		9,6										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		11,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		48,8										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		6,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		75,9										
Máx.24h		48,8										
Día Máx.		14										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		37,1										
2		85,1										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		6,1										
11		0,0										
12		0,0										
13		9,4										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,2										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		137,9										
Máx, 24h		85,1										
Día Máx,		2										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		10,7										
2		0,0										
3		32,8										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		1,6										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		45,1										
Máx.24h		32,8										
Día Máx.		3										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Dirección de Meteorología e Hidrología - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		20,0										
2		0,2										
3		T										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		40,8										
11		0,0										
12		10,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		2,4										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		20,8										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		94,2										
Máx. 24h		40,8										
Día Máx.		10										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MEMORIA RESPALDATORIA DE LLUVIA Y SUS EFECTOS

MES DE FEBRERO – 2021

En el mes de Febrero/2021, se registraron lluvias los dias 01/02/03 respectivamente, ocasionando suspension de los trabajos en los dias mencionados, asi como en fecha 04 se han suspendido los trabajos por los efectos de lluvia de los dias anteriores.-

Tambien se ha registrado lluvia el dia 10/12/13 y 14, con suspension de los trabajos en esas fechas y efectos de lluvia con suspension de los trabajos en fecha 11 y 15 respectivamente.-

Finalmente se ha registrado lluvia en fecha 24, con suspension de los trabajos en esa fecha y por efecto de lluvia con suspension de los trabajos en fecha 25.-

Los rubros suspendidos por causa de las lluvias y sus efectos fueron:

- Muro tapial/tierra (Esc. N° 502-San Juan Bosco)
- Estructura de HoAo-vigas y losas (Esc N° 1251 San Francisco de Asis-Esc N°568 Las Residentas-Esc N° 182 Antoliano Garcete)
- Aislacion de losas (Esc N° 182 Antoliano Garcete)
- Instalaciones sanitarias (Esc N° 182 Antoliano Garcete)
- Piso de H° pulido (Esc N° 182 Antoliano Garcete)

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

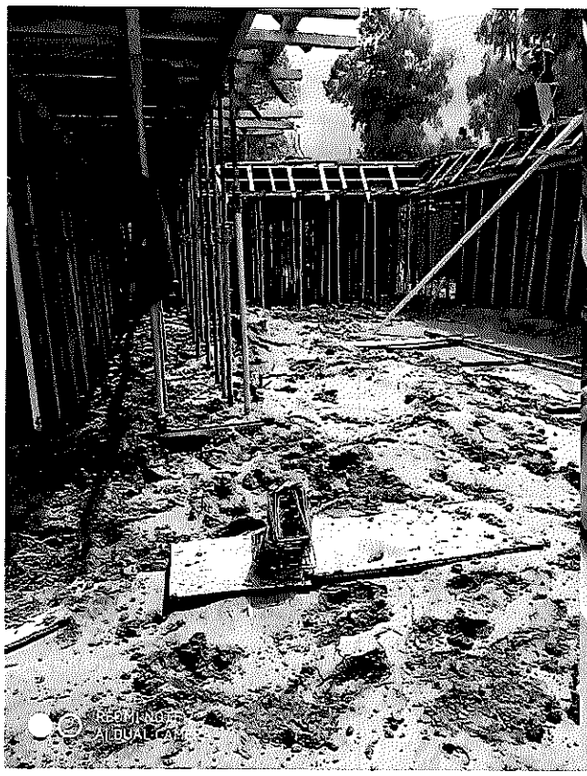

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDNº 356.937

Nº 0000236

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 15/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA –	Sin actividad por efecto de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			lluvias de tipical.	

INCIDENCIAS

DÍA: 15/02/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – MURO TRIPIÁL / FIJADA –			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 Nº Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000235

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 14/02/2021

CONTRATISTA /

TRABAJOS EJECUTADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA -

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14/02/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- MUROTAPIA / TIERRA -

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	Lluvias de tapiral.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DF Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000232

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efecto de las lluvias caídas

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:				
HORA	COMIENZO:		Muro de	
	FIN:		tapial	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA: 11/02/2021			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – MURO TAPIAL / TIERRA			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Suelo Humedecido y Saturado.

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000231

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 10/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 10/02/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:		Muro de tapial.	
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
– Muro Tapial: 20m –				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000225

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 04/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA –	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:				
HORA	COMIENZO:		Muros de	
	FIN:		Tapial.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA: 04/02/2021			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – MURO TAPIAL TIERRA –			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000224

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 03/02/2021

CONTRATISTA / TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS. AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Día de lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 03/02/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:		Muro de tapial	
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
– Muro tapial / Mora –				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000221

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 01/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Trabajos suspendidos debido a las incidencias climáticas –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 01/02/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– Estructura de H°A° (vigas y losas) –		HOY –	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Reg. MOPC N° 4081

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1896 c/ Fernando de la Mora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000222

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 02/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 02/02/2021
HORA COMIENZO:
FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– Estructuras de Ho°A° (vigas y losas)		HoA° –	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
Reg. MOPC N° [illegible]

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 p/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X2 Nº De [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000223

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 03/02/2021

CONTRATISTA	FISCAL
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por efecto de lluvia -	Sin posibilidad de realizar actividades por suelos muy saturados de agua.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 03/02/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - ESTRUCTURA HºAº -		HºAº —	
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Reg. MOPC N° 4031

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - Do 50X3 N° Del 0001 al 0200 - 05/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000230

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 10/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas a causa de las inclemencias climáticas. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 10/02/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Encofrados	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
– ESTRUCTURA DE HºAº –			7	
			Armaduras	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Ing. Fernando Moreno
Reg. MOPC N°4061

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZADOR	SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Rosvibé Gonzalez N° 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000231

LIBRO DE OBRAS

INSITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de reanudar los trabajos debido a los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 11/02/2021 –	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Estructura H.A. –		Armaduras –	

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - Dr. [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000233

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 13/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/02/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
– Estructura de H°A° –		H°A° –	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Plantas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000234

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 14/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de reanudar los trabajos debido a que los lotes se encuentran muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 14/02/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - ESTRUCTURA HºAº -		HºAº. —	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Rosario Ocampos N° 1895 c/ Encarnación de la Merced - 2 Block - De 50X2 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000221

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 09/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	lluvia.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 09/02/2021
HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– ESTRUCTURA DE Hº Aº.		Estructura de Hº Aº.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Jorge R. Meganelli
Ingeniero Civil
Reg. 9.147
CI N° 3.170.115

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000222

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 02/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Por efecto de las lluvias se imposibilito el trabajo.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros de tapial				
Estructura de Hº Aº				

INCIDENCIAS

DÍA: 02/02/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Estructura de Hº Aº			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000223

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 03/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Sin actividades por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 03/02/2021
HORA — COMIENZO: — FIN:
TRABAJOS SUSPENDIDOS:
– Estuvo fuera de hora –

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Estructura de	
	la A°	
	Muros de	
	tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA:
TRABAJOS SUSPENDIDOS:
FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000224

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR; JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 04/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad por efecto de lluvia-	Se impositivo el trabajo por efecto de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Estructura de H° A°. Muros de tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA: 04/02/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS: -Estructura H°A°

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Apoderado

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000221

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 01/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 01/02/2021

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:		HORAS –	

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

– ESTIMUGUIS HORAS –

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000222

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 02/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de reanudar los trabajos debido a los suelos muy (saturados) saturados –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 02/02/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Estructura techo.		H°A°. –	

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZADOR	SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000230

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 10/02/2024

CONTRATISTA/ TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 10/02/2024

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Fijación de losas –

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 c/ Fernando de la Mora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000231

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 11/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de reanudar actividades debido a que los suelos se encuentran muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 11/02/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Aislación de Losas.		Aislación	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Fernando Moreno
Reg. MOPC N° 4001
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000232

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 12/02/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas.–

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12/02/2021

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Aislación de losas.–	
–Aislación de losas–				

INCIDENCIAS

DÍA:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Ing. Fabio Saravia
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000236

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 13/02/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de realizar actividades debido a que los lugares se encuentran llenos de agua.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 13/02/2024 –

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Aislación de losa –		Aislación. +	
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 p/ Fernando de la Mora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000244

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 24/02/2021

CONTRATISTA	FIS AL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Suspensión por lluvia –	Actividades Suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/02/2021 –

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Ejecución de losa piso de HºAº. Registros exteriores.	
- Nivelación losa				
- Instalación sanitaria				
- P. Sobre la Pluvial.				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 c/ Fernando de la Mora - 2 Pl...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000243

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dptc. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 25/02/2021

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad por efecto de lluvia-	Sin posibilidad de reanudar actividades debido a que las losas se encuentran llenas de agua y los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 25/02/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
-Distritos Loma/ Dist. Santaría/ P. Sotto Pulido Aislación			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
